


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

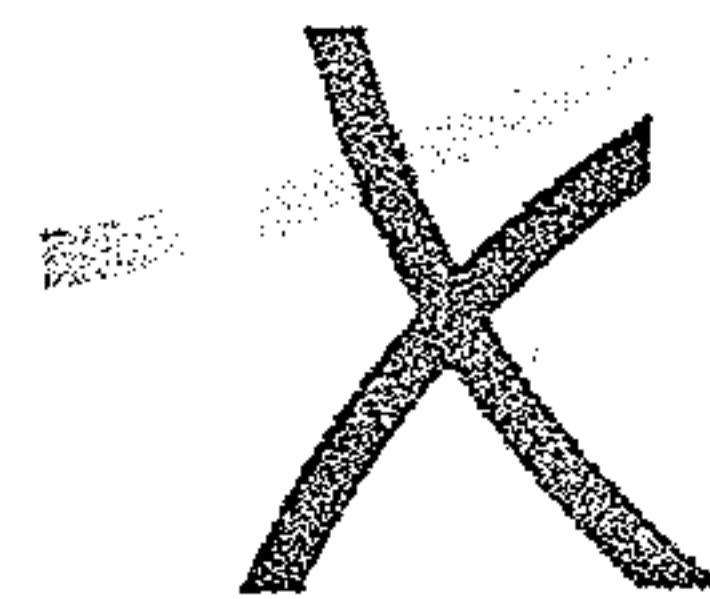

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 2


Днес, 11.02.2020 г., в 10:00 часа, в сграда Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № Рзз-374/24.01.2020 г., на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив за извършване на подбор, разглеждането, оценката и класирането на офертите на участниците в публично състезание по ЗОП с предмет: **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА СГРАДА НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ЕТАП II, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0005-C01”**, открита с Решение № Рзз- 7064/20.12.2019 г., на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” и уникален идентификационен номер в РОП 00858-2019-0010 по Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”.

На основание Глава пета, раздел VIII от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № Рзз-374/24.01.2020 г., на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Комисията в състав:


Председател: Румен Кирилов Киров – помощник ректор АСД;

Членове: 1. проф. д-р Невена Стоянова Милева – помощник ректор ПНПП;
2. Иво Костадинов Кемалов – с квалификация юрист
3. проф. д-р Илия Николов Илиев – директор на ТЦ
4. арх. Ганка Любенова Богданова


----- www.eufunds.bg -----

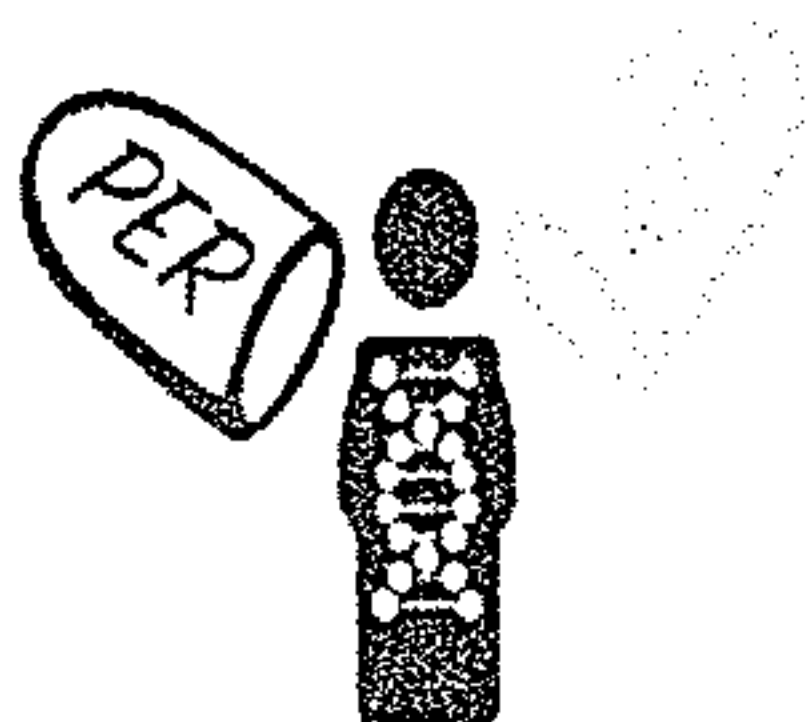

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност
„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

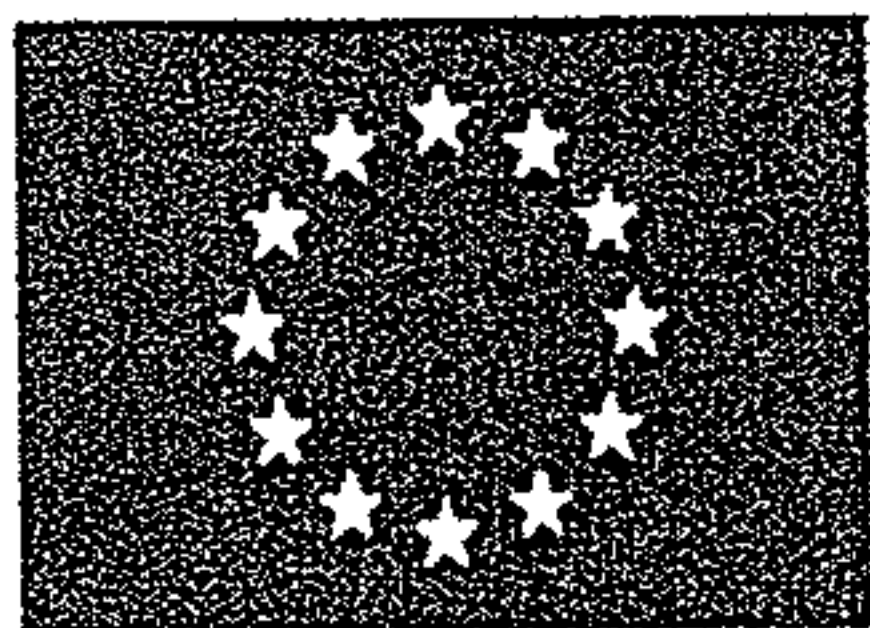

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

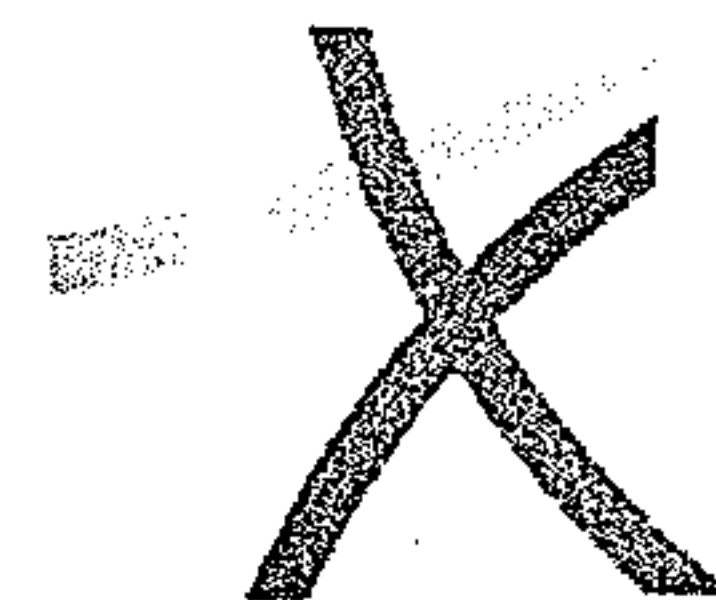

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

започна работата си на закрито заседание, на което се разгледаха и оцениха Техническите предложения на участниците по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Техническо предложение на „БИЛДКОМ БГ” ЕООД

Техническото предложение е изготвено съгласно Приложение № 3 към документацията за участие. Техническото предложение съдържа декларация, че участникът е съгласен с условията на проекта на договор; декларация за срок за на валидност на офертата 12 месеца; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 60 /шейсет/ календарни дни. Предложени гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи са определени съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /.стр.9,т.9/. Като приложение към Техническото предложение са представени:


- Линеен график;
- Предложение за изпълнение на поръчката;

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и констатира следното:


Част 1: Технология на изпълнение на строително-монтажните работи.

В същото са описани технологията и технологичната последователност за изпълнение на СМР. Предложени са срокове за изпълнение на СМР. Предложената технология за изпълнение е приложима за строежа – предмет на поръчката.


----- www.eufunds.bg -----

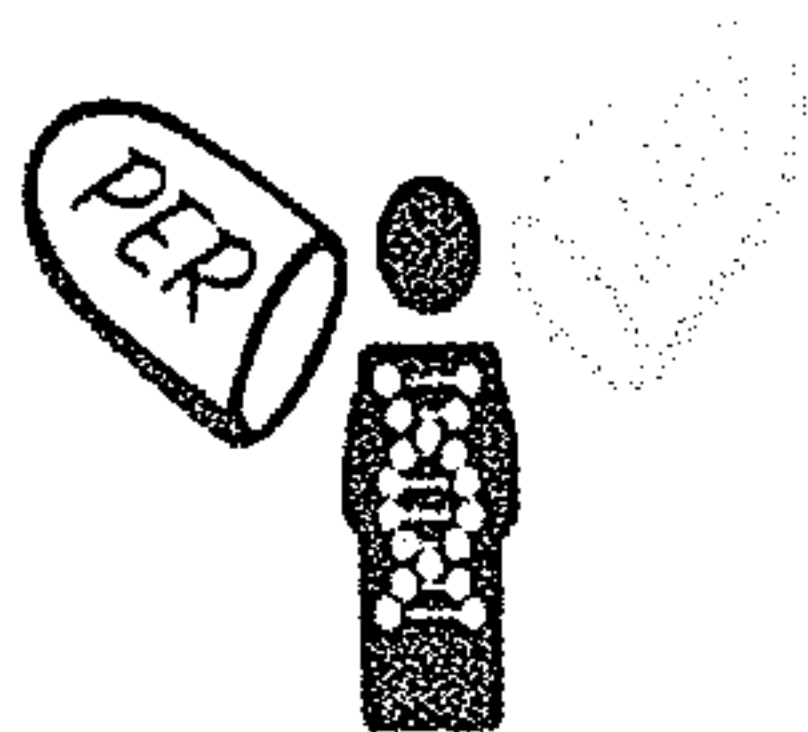

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност
„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

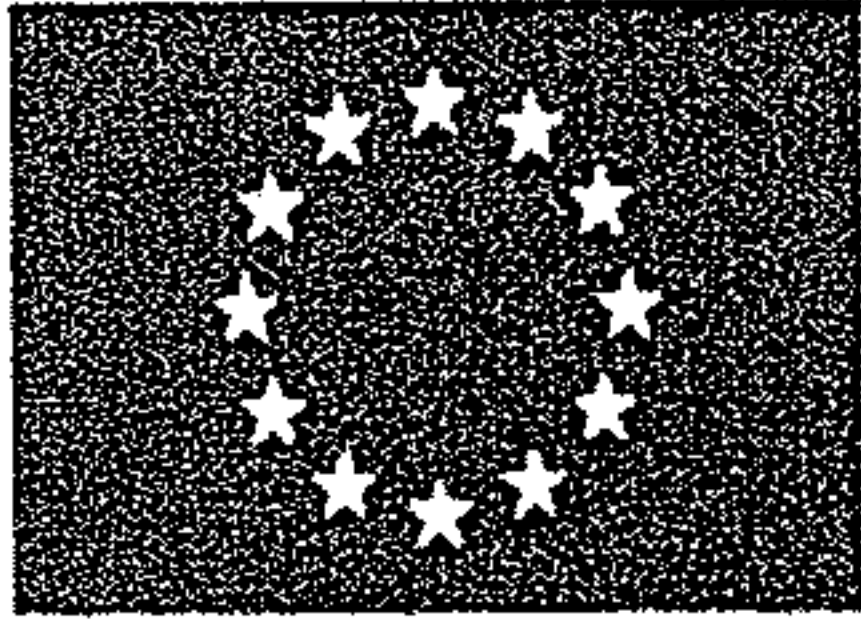

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

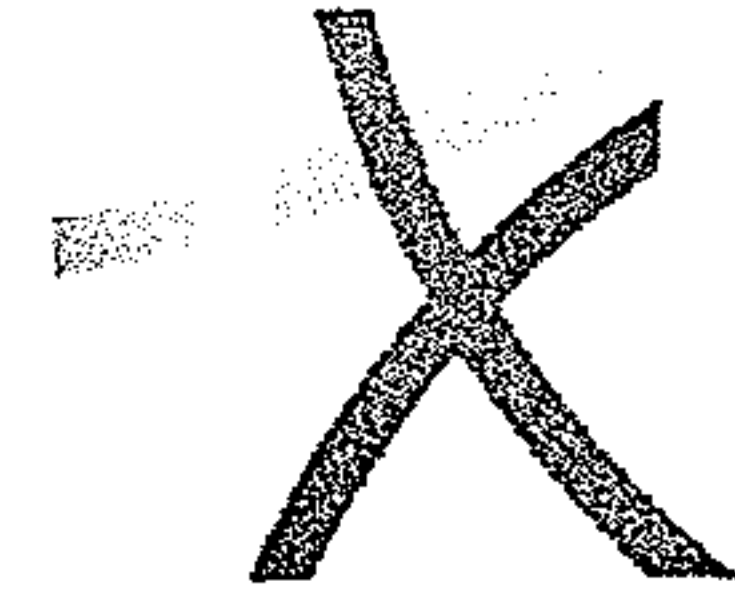

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Предложението за изпълнение на строително-монтажните работи е разгледано няколко части:


- Описание на технологичната последователност и срокове на изпълнение:

Приложено е описание на съдържанието на СМР /от стр.11 до стр.14/ и на тази база използвайки количествените сметки по отделните видове работи в табличен вид от стр.14 до стр.23 е показана технологичната последователност на всички СМР, като продължителност в дни, с условно начало и условен край за всяка позиция от обявените на сайта на ПУ "Паисий Хилендарски" количествени сметки по части ВиК, Архитектура, асансьорна уредба, ЕЛ инсталации входно фоайе и площадки пред асансьора, мълниезащитна инсталация, Конструкции, Пожарна безопасност, ОВК инсталации, Благоустройство, площадкови кабелни мрежи и Фасадна топлоизолация на съществуващата пететажна сграда. От стр.24 до стр.36 е третирано правилното протичане на работния процес и изпълнението на дейностите с обезпечаване от необходимия брой работници и вида на механизацията, представено също в табличен вид, използвайки количествените сметки по всички видове работи


- Технология на изпълнение на строително монтажните работи:

Технологията за изпълнение на СМР на пристройката с асансьор е описана от стр.37 до стр.78 и включва подробно описание на изпълнението на: тухлени зидарии, демонтаж на дограма –прозорци, оформяне на отвори в тухлен зид, технология за изпълнение на леки преградни стани от гипсокартон, технология за изпълнение на дограма, технология на изпълнение на вътрешно обръщане около дограма, изпълнение на външно обръщане около дограма, изпълнение на външни и вътрешни подпрозоречни первази, изпълнение на интериорни врати, технология за изпълнение на алуминиеви врати, изпълнение на метални врати, изпълнение на варова/вароциментова мазилки, технология за изпълнение на циментова замазка и


----- www.eufunds.bg -----

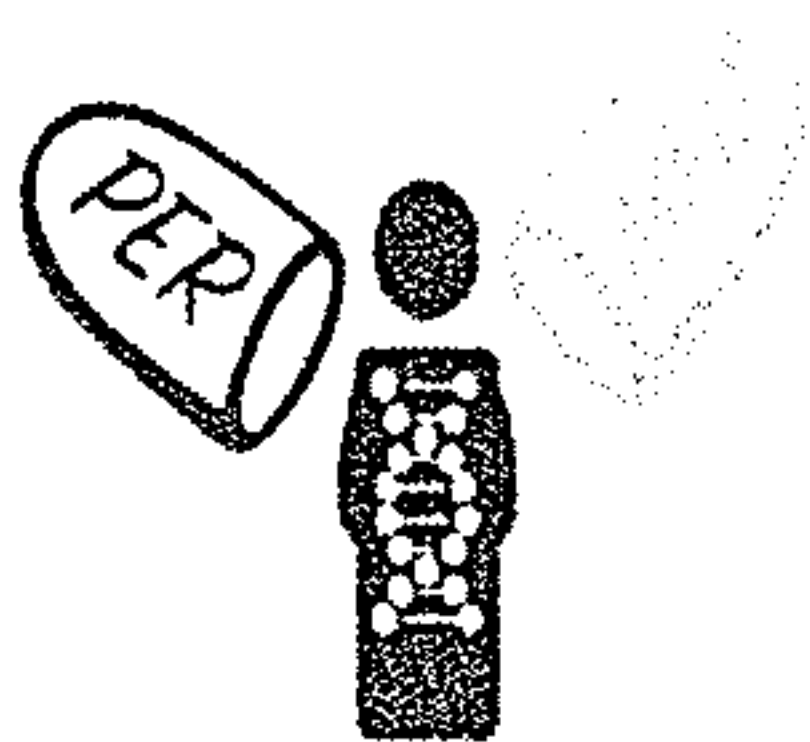

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност
„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

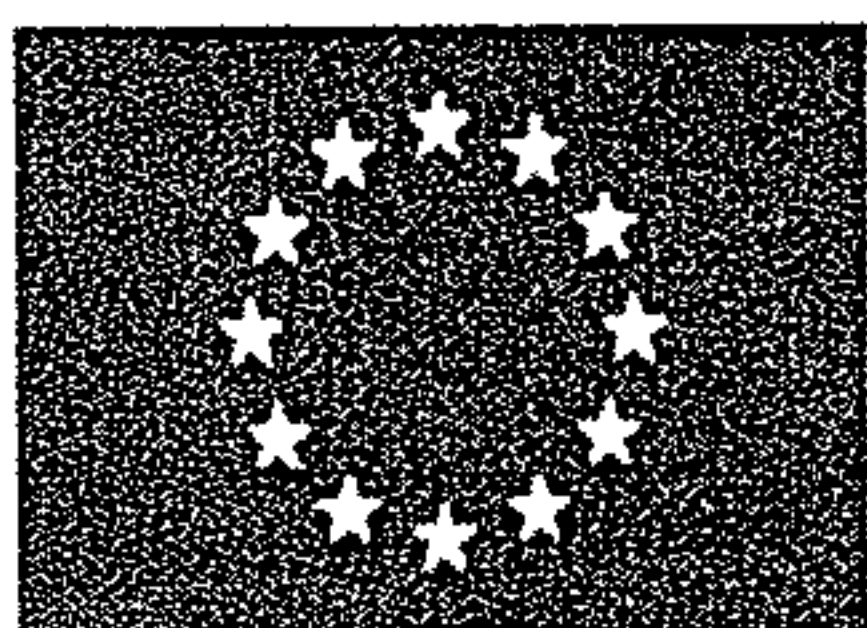

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

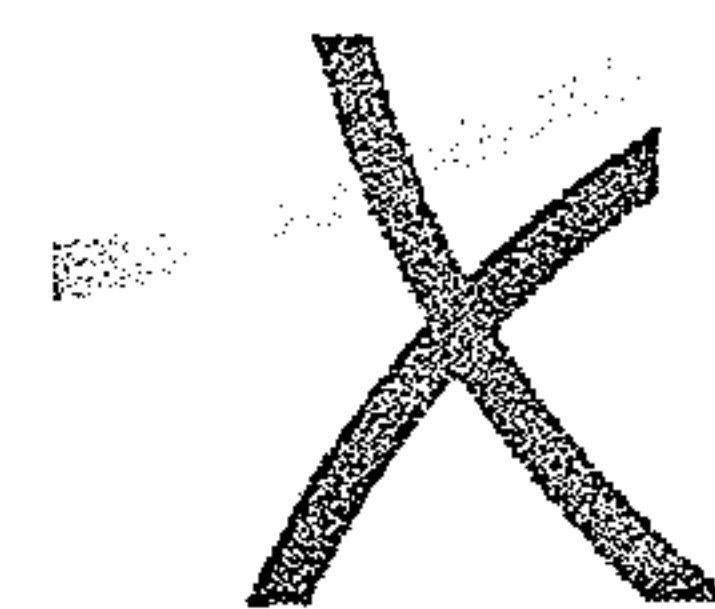

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

настилка от гранитогрес, технология на боядисване с латекс, технология за изпълнение на растерен окачен таван, технология на изпълнение на инсталиране на скелета, технология за изпълнение на ТИС /топлоизолационна система/, технология на изпълнение на покривни работи и термопанели за покривно покритие, технология за изпълнение на кофражни работи, технология за изпълнение на армировачни работи, технология за изпълнение на бетонови работи, технология за изпълнение на стоманена конструкция, технология за изпълнение на земните работи, технология за изпълнение на бордюри и тротоарни настилки, изпълнение на озеленяване, технология за изпълнение на СМР по час Електро, технология за изпълнение на СМР по част ВиК, със списък на проложими закони и наредби, включително и изпитване, технология за изпълнение на СМР по част ОВИК. Изпълнението на фасадна облицовка с врачански камък и композитни материали и съпътстващата ги фасадна топлоизолация от минерална вата е посочено в линеен график.


Част 2: Предложение относно организация на строителната площадка.

Описаната организация на строителната площадка се отнася до конкретния строеж, предвид неговите характеристики и особености и е съобразена с предложената технология за изпълнение на СМР. Организацията на строителната площадка е описано от стр.87 до стр 92. От стр.92 до стр.99 са третирани основни принципи на организация на изпълнение на поръчката, които ще бъдат прилагани. Включват методи и похвати, като организацията е разделена на три етапа–първи етап подготвителни работи, втори етап строителство и трети етап-финализиране на строителството. Всеки от по-горните етапи е описан детайлно.


Част 3: Предложение за ресурсно обезпечаване с работна сила/работници, механизация и строителни продукти.

Посочени са ресурсите, които ще бъдат осигурени, като е представен и план за осигуряването и организацията им с цел прилагането им на конкретния строеж.

----- www.eufunds.bg -----

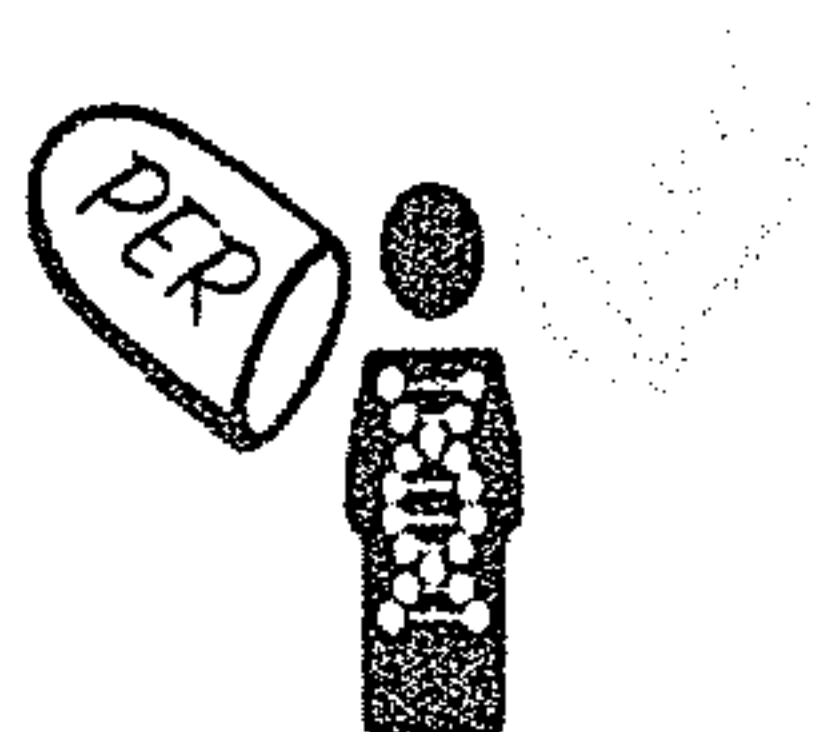

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност
„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

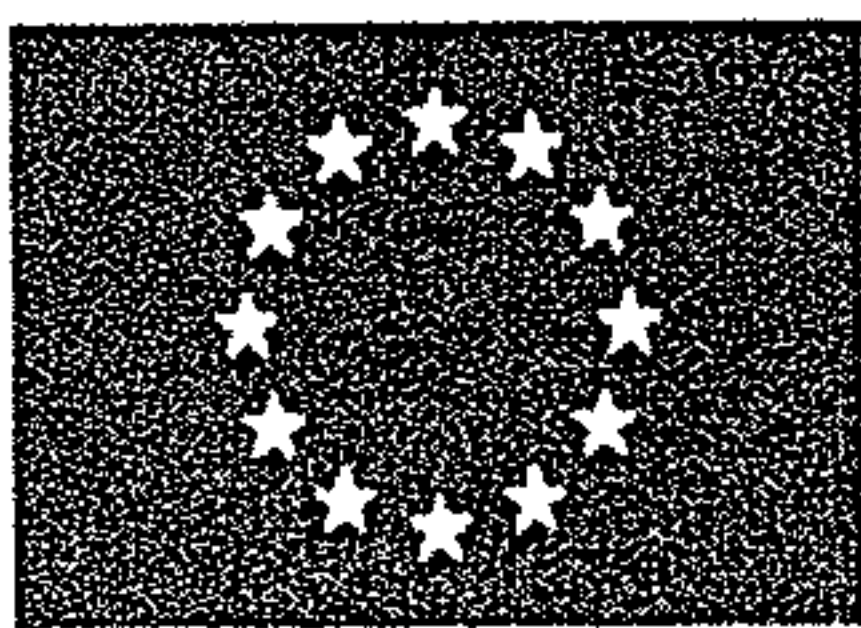

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Техническото предложение е описано от стр.79 до стр.86 и е приложен списък на цялото оборудване и механизация, необходими на екипа за изпълнение на задачите, съобразено линейния график. Ресурсното обезпечаване с работна ръка е разгледано в табличен вид от стр.25 до до стр.36. Ресурсното обезпечаване на строителни продукти е разгледано от стр.100 до 103 - доставка на материали, изделия и оборудване. От стр.114 до стр.120 приложен списък на видовете материали и сертификатите, които ги придружават. От стр.103 до стр.104 е посочена обезпеченост с работна ръка. Третиран е и метода, техниката и начина на работа за ограничаване на ликвидиране на пожар и аварии. Третирано е шумовото замърсяване и замърсяването на околната среда.

Част 4: Предложение за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите по строителството.

В същото са описани процесите на осъществяване на контрол по време на строителството и очакваните резултати. Съдържа се от стр.104 до стр.123. Посочени са:

Задължения и отговорности на техническия ръководител;


Задължения и отговорности на отговорник по безопасност и здраве;

Основни задължения на отговорника по контрол на качеството;


Разпределение на експертите, ангажирани в бетоновите работи, армировъчните и всички останали видове строителни дейности са описани подробно. На стр.120 до 126 е описана организацията на работната сила, методите за координация и съгласуване на дейностите, механизми за координация и е приложена таблица с маркирани мерки в случай, че по време на СМР възникне обстоятелство, нарушаващо организацията на строителния процес и на строителната площадка.

Линеен график:


----- www.eufunds.bg -----

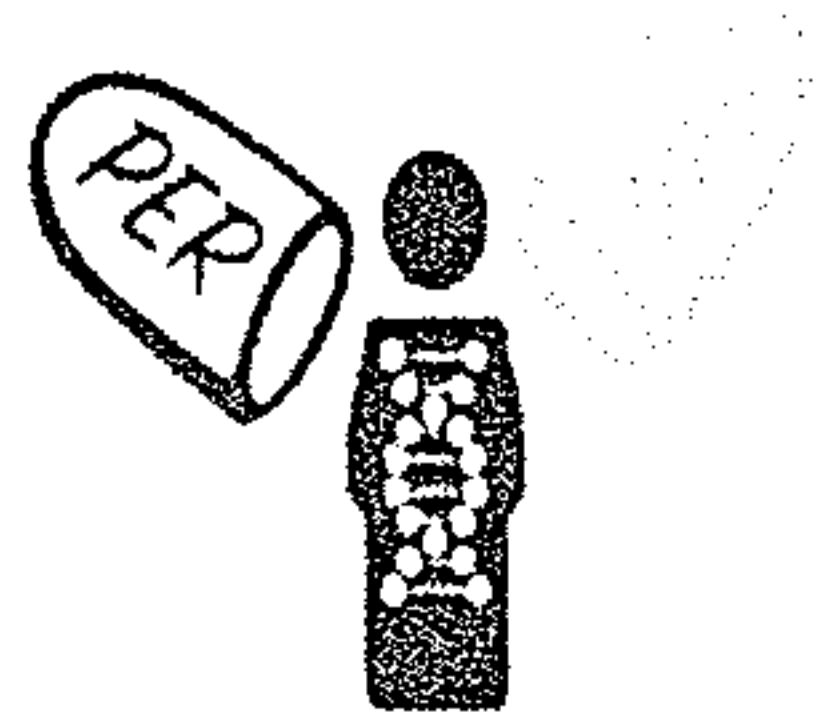

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност
„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

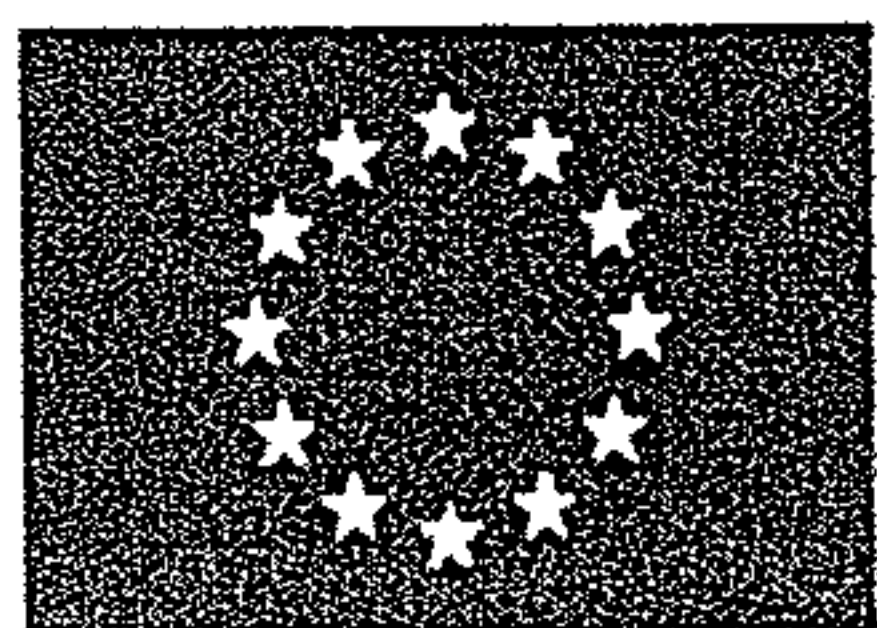

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

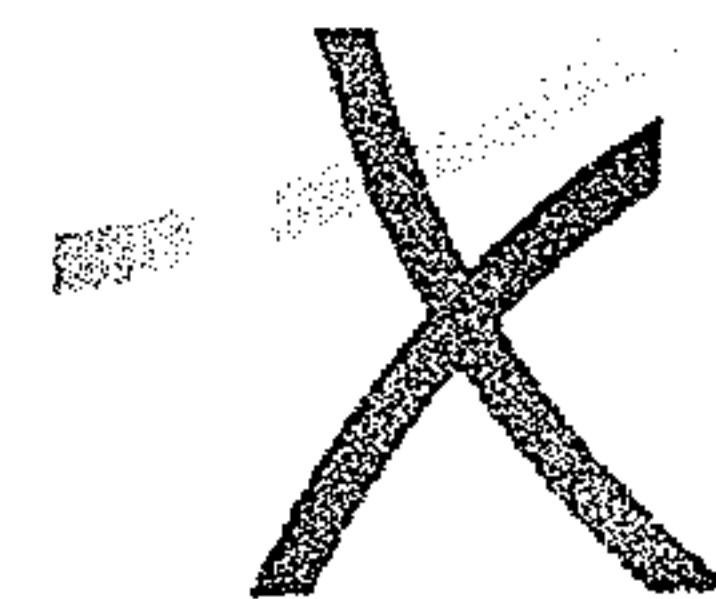

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ


Приложен е график за изпълнение на поръчката. В същия са онагледени хода на строителството и на отделните му етапи и показва съвместимостта на строителните операции и съответствието на строителната програма. В същия са отразени етапите на изпълнение и разпределението на работната сила. Представеният линеен график отразява технологичната последователност на предвидените дейности, тяхната продължителност, начален и краен ден за всяка дейност. Посочена е също така последователността и взаимната обвързаност между отделните дейности в рамките на предложения срок за изпълнение. Към линейният график е приложена и диаграма на работната ръка, като е налице съответствие между тях и останалите части от техническото предложение.

След подробно анализиране на отразените в Техническото предложение обстоятелства, комисия смята, че същото съответства на техническото задание и отговаря на условията поставени от възложителя. С оглед на тази констатация комисията реши, че **допуска** участника „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД до етапа на отваряне на ценовите оферти.


2. Техническо предложение на „ПИРС - Д“ ООД

Техническото предложение е изготвено съгласно Приложение № 3 към документацията за участие. Техническото предложение съдържа декларация, че участникът е съгласен с условията на проекта на договор; декларация за срок за на валидност на офертата 12 месеца; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – **120 календарни дни**. Предложените гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи са определени съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и

----- www.eufunds.bg -----

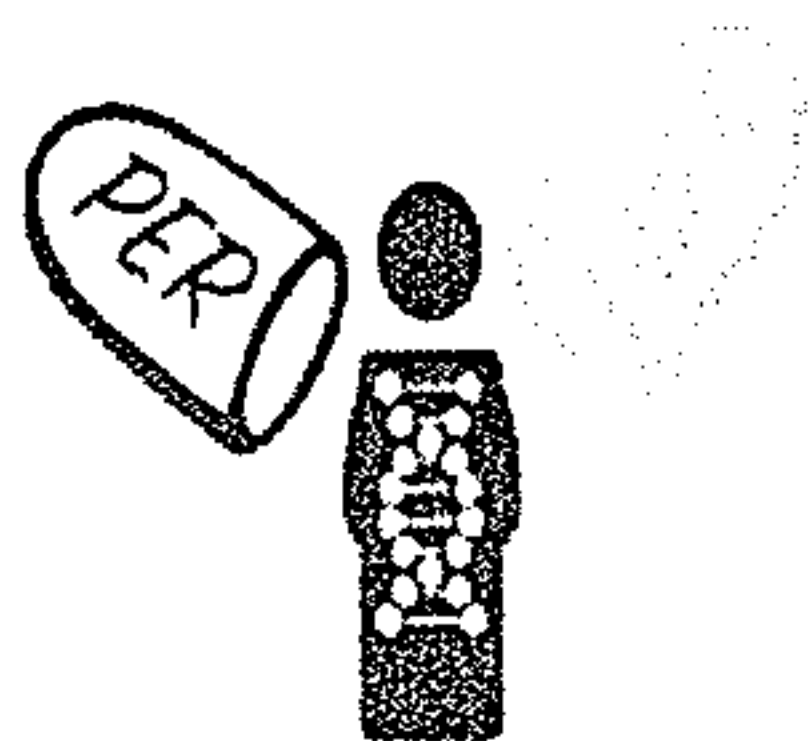

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност
„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

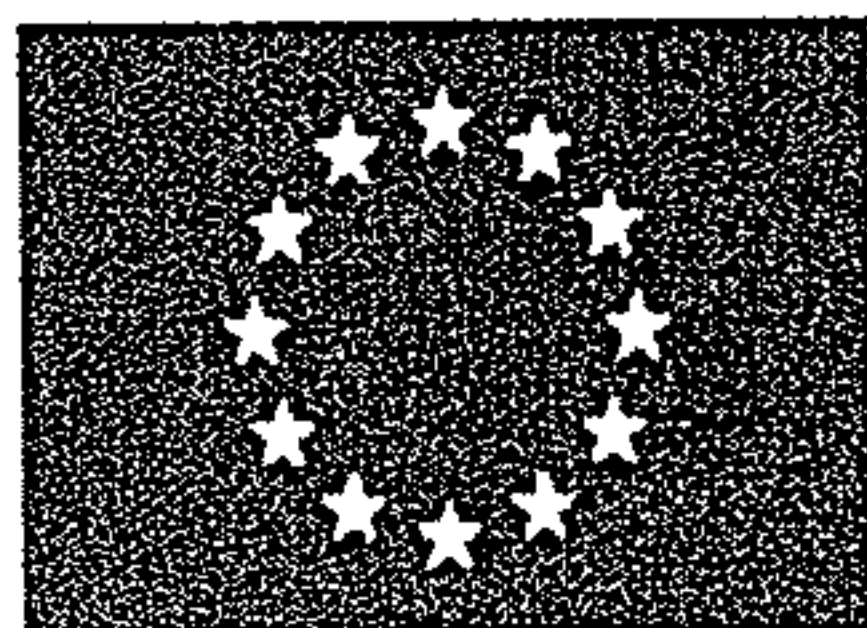

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

строителни обекти /стр.6,т.9/. Като приложение към Техническото предложение са представени


- Линеен график
- Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и констатира следното:


Част 1:Технология на изпълнение на строително-монтажните работи

В същото са описани технологията и технологичната последователност за изпълнение на СМР. Предложени са срокове за изпълнение на СМР. Предложената технология за изпълнение е приложима за строежа – предмет на поръчката. Предложението за изпълнение на строително-монтажните работи е описано от стр.10 до стр.25 и включва подробно описание на изпълнението на: земни работи-изкопи и насипи, кофражни, армировъчни и бетонови работи, монтаж и демонтаж на фасадно скеле, демонтажни работи, направа на тухлена зидария, тенекеджийски работи, топлоизолационни работи, включващи дейностите по изпълнение на фасадна топло изолация и полагане на фасадна мазилка, хидроизолационни работи, технология за монтаж на гипсокартон, изпълнение на настилка от гранитогрес, направа на циментова замазка, шпакловъчни и бояджийски работи, изпълнение на растерен окачен таван, монтаж на дограма, мазачески работи, изпълнение на В и К инсталации, включително, изпитване и дезинфекция на водопровода и изпитване на канализацията, изпълнение на ОВК инсталации, Електро инсталации, площадкови кабелни мрежи и мълниезащитна инсталация, настилка от тротоарни плочки и полагане на скрити градински бордюри. Изпълнението на фасадна облицовка с врачански камък и композитни материали и съпътстващата ги фасадна топлоизолация от минерална вата, доставката и монтаж на асансьорна уредба; изпълнение на стоманени конструкции са посочени в линейния график. Технологичната последователност на изпълнение на строително монтажните


----- www.eufunds.bg -----

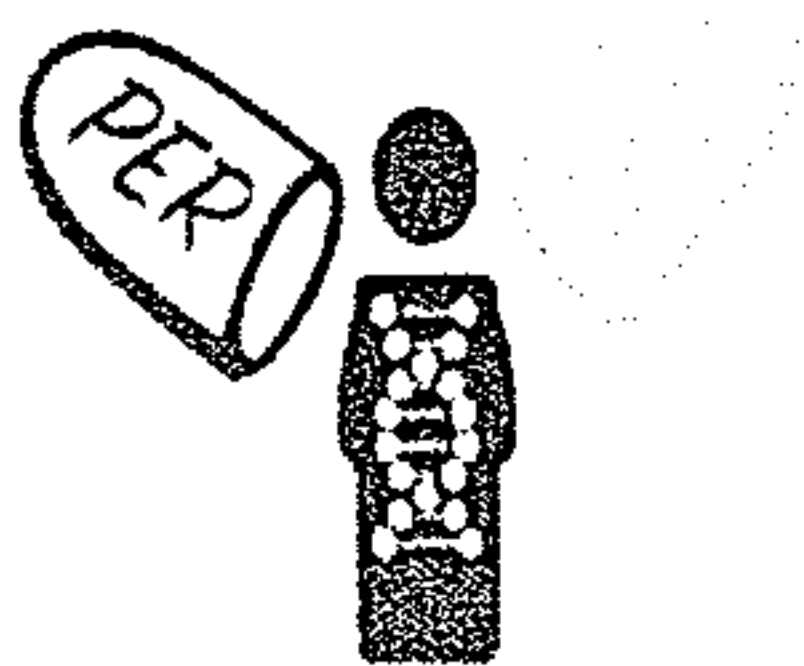

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

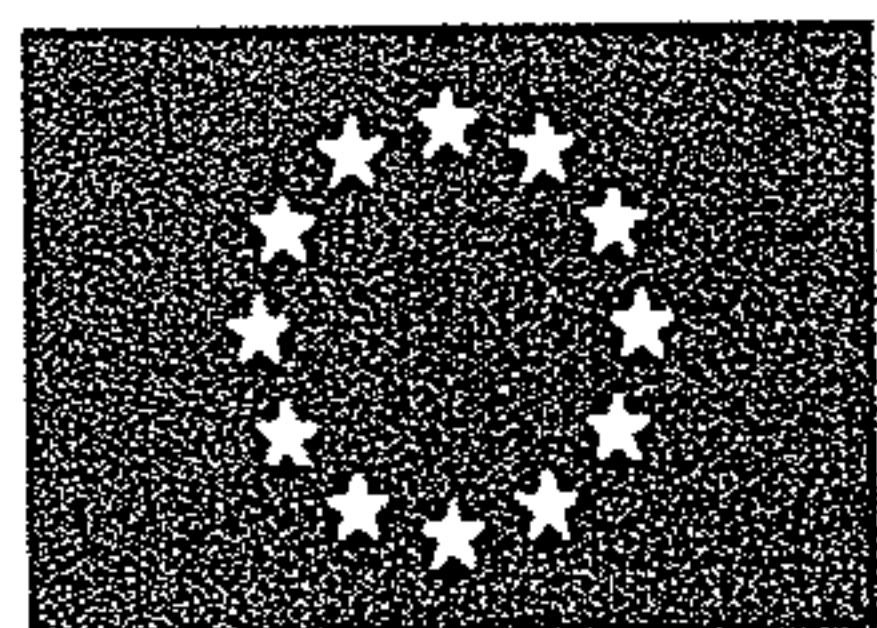

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

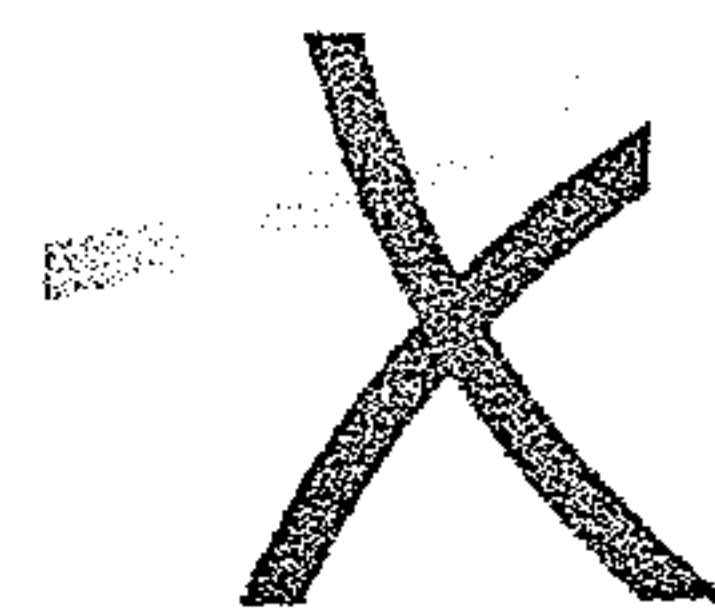

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

работи в рамките на първи, втори, трети и четвърти месеци са описани на стр.24. Срокът за изпълнение е определен на стр.25 и възлиза на 120 календарни дни./4 месеца/.

Част 2: Предложение относно организация на строителната площадка.


Описаната организация на строителната площадка се отнася до конкретния строеж, предвид неговите характеристики и особености и е съобразена с предложената технология за изпълнение на СМР. Организацията на строителната площадка е описано от стр.25 до стр.28, като са посочени отделните видове операции при организацията на строителната площадка. На стр.26 е приложена Скица за организиране на временната строителна база /приобектна площадка/. Предвижда се при възникване на затруднения при планираната организация на строителната площадка при вход- изход до нея, разширение на подхода към строителната площадка, чрез разрушаване на постоянната ограда, както и почистване на дървесната растителност в непосредствена близост до входа, чрез съгласуване с Община Пловдив.

Част 3: Предложение за ресурсно обезпечаване с работна сила /работници, механизация и строителни продукти.


Посочени са ресурсите, които ще бъдат осигурени, като е представен и план за осигуряването и организацията им с цел прилагането им на конкретния строеж. Техническото предложение е описано от стр.28 до стр.34 и е разгледано по части: работници, обезпечаване с материали, механизация и инструменти. Третиран е и контрола на качеството по време на строителството, който ще се осъществи чрез описаните мерки:

- система за управление на качеството съгласно сертификат ISO 9001:2015
- план за осигуряване и организация на ресурсите, свързано с контрол при получаване на материали и продукти, контрол при заявяване /закупуване на

----- www.eufunds.bg -----

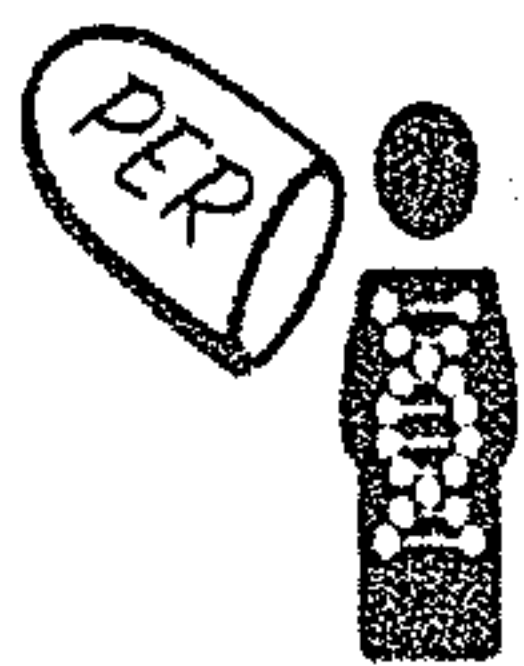

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност
„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

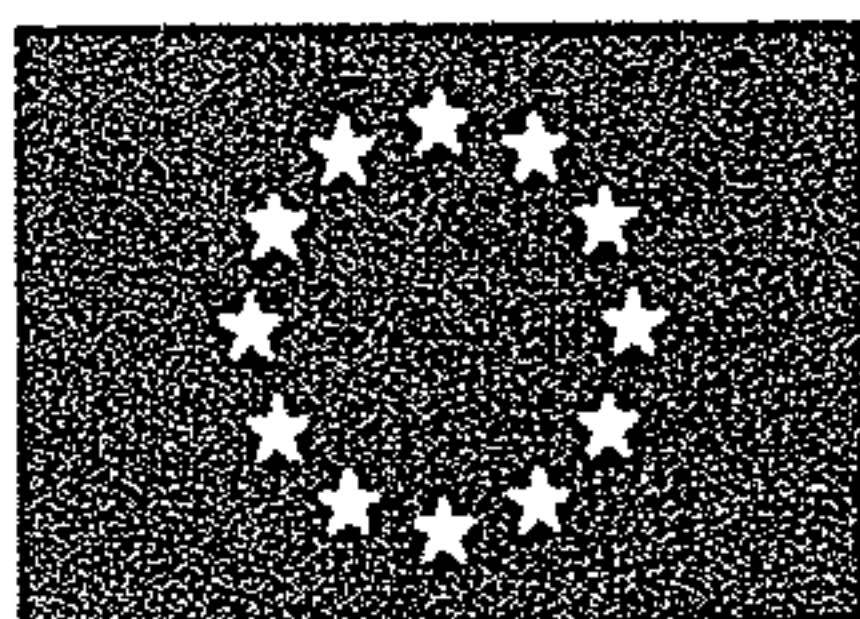

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

продукти, контрол на качеството на труда, координация/съгласуване/ при изпълнение на СМР с Възложителя.

Част 4: Предложение за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите по строителството.

В същото са описани процесите на осъществяване на контрол по време на строителството и очакваните резултати. Съдържа се от стр.34 до стр.40. Описани са ключовите експерти, техните отговорности и задължения, включващи:


- Технически ръководител;
- Отговорник по качеството;
- Отговорник по безопасност на труда;

Третирани са задълженията и отговорностите на всеки от тях, взаимната им връзка по време на строителството, контрола върху сроковете, гарантиращ изпълнение и качество на строителството. Предвидени са и организационни мероприятия за недопускане на забавяне на строителството, спрямо работната и междинните програми, чрез оптимизация на работното време и оптимизация на ресурсите.


Линеен график:

Приложен е график за изпълнение на поръчката. В същия са онагледени хода на строителството и на отделните му етапи и показва съвместимостта на строителните операции и съответствието на строителната програма. В същия са отразени етапите на изпълнение и разпределението на работната сила. Представеният линеен график отразява технологичната последователност на предвидените дейности, тяхната продължителност, начален и краен ден за всяка дейност. Посочена е също така последователността и взаимната обвързаност между отделните дейности в рамките на предложения срок за изпълнение. Към


----- www.eufunds.bg -----

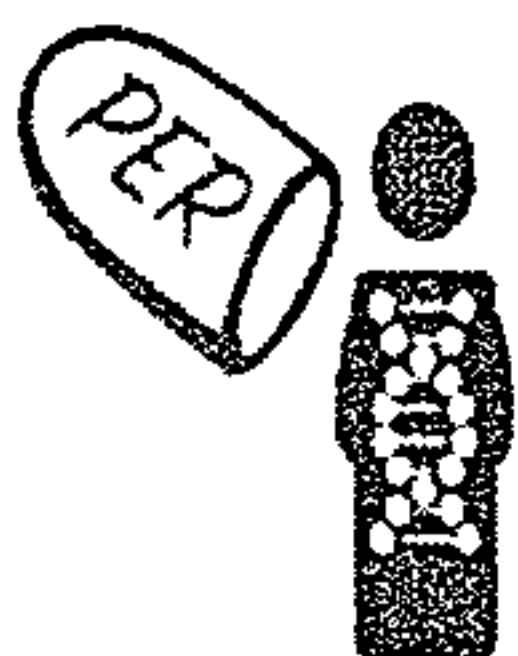

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност
„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

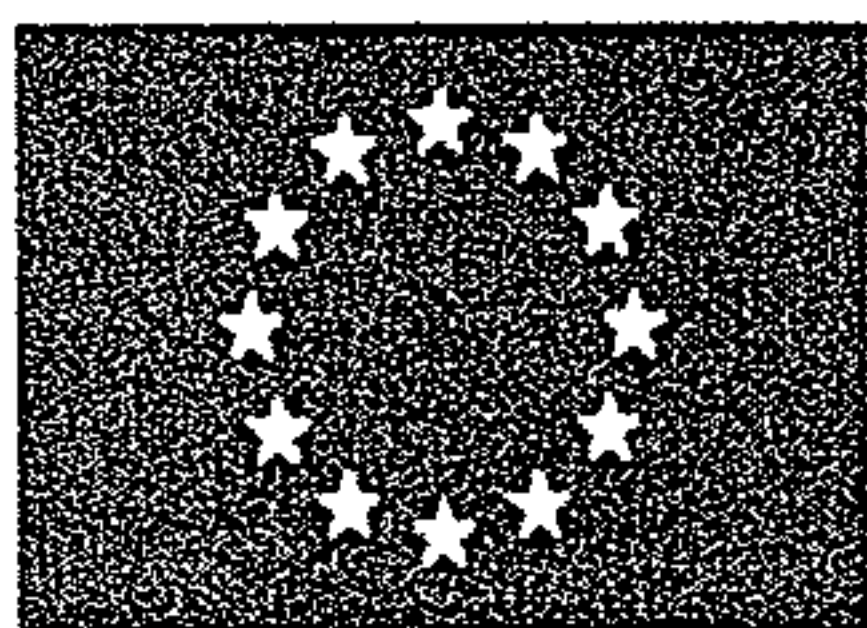

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

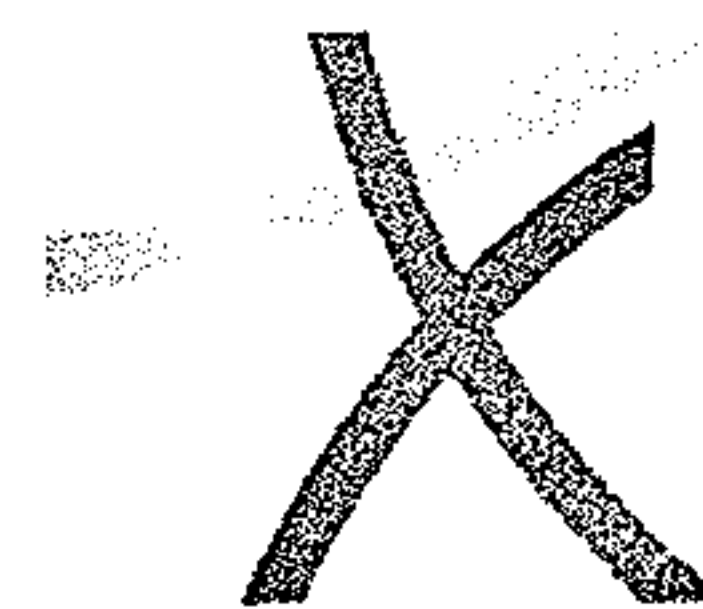

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

линейният график е приложена и диаграма на работната ръка, като е налице съответствие между тях и останалите части от техническото предложение.

След подробно анализиране на отразените в Техническото предложение обстоятелства, комисия смята, че същото съответства на техническото задание и отговаря на условията поставени от възложителя. С оглед на тази констатация комисията реши, че допуска участника „ПИРС -Д“ ООД до етапа на отваряне на ценовите оферти.


II. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Съгласно утвърдената от Възложителя документация, обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерий „Оптимално съотношение качество/цена“, което се оценява въз основа на предложената цена и на определени от възложителя показатели, свързани с предмета на обществената поръчка /чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП/. Офертите на участниците се оценяват и класират според определения критерий за възлагане, по следните показатели със съответна относителна тежест:


1. Показател „Предложена цена” (Пц) – максимален брой точки - 80;
2. Показател „Срок за изпълнение” (Пси) – максимален брой точки – 20;

С оглед на горното и на основание чл.57, ал.2 от ППЗОП, комисията извърши оценка на офертите по Показателя „Срок за изпълнение” (Пси). Оценката по Показателя „Срок за изпълнение” (Пси) се определя, като се изчисли съотношението между най-краткия срок за изпълнение в календарни дни, предложен от участник (Сизп/мин), и срокът за изпълнение в календарни дни, предложен от участника, чиято оферта се оценява (Сизп/уч), по следната формула:


----- www.eufunds.bg -----

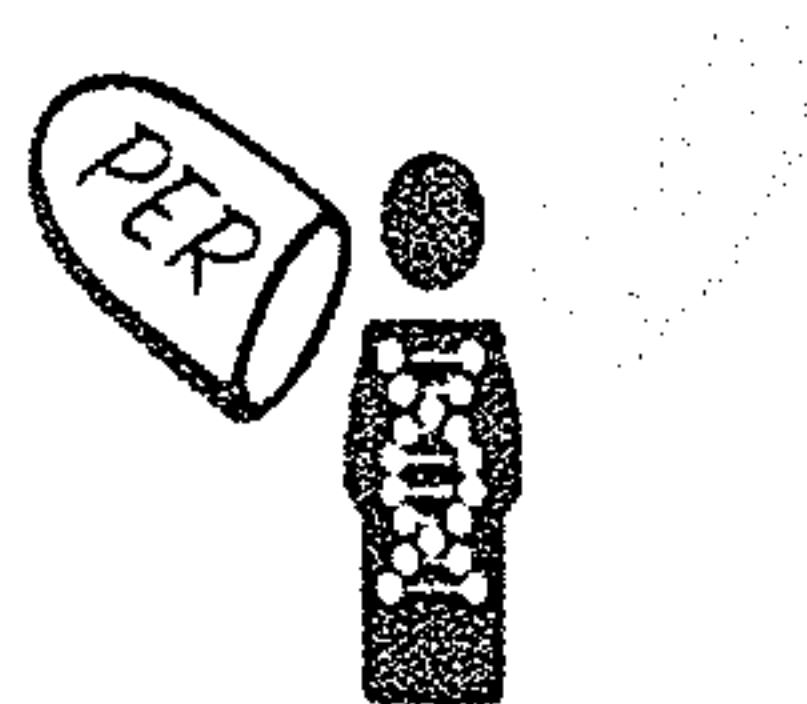

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност
„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

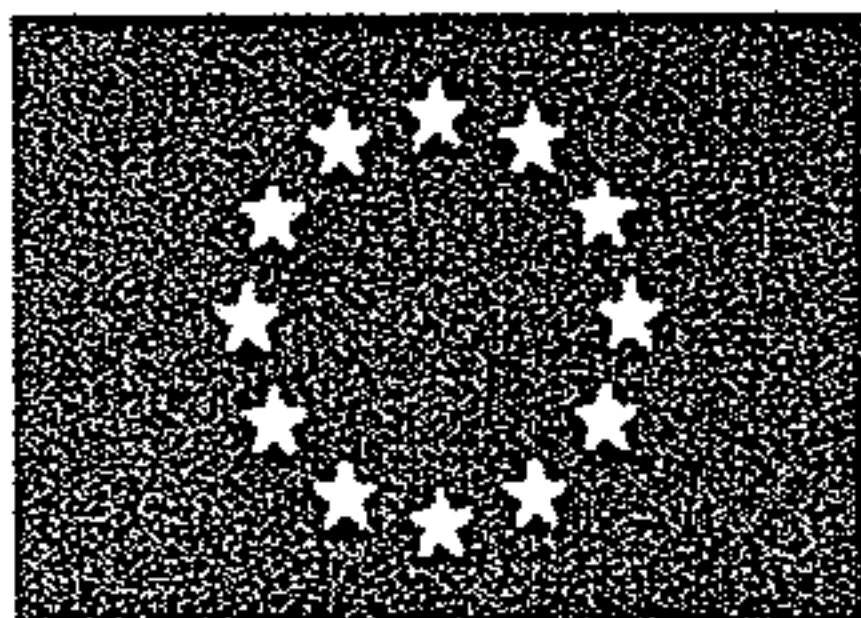

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

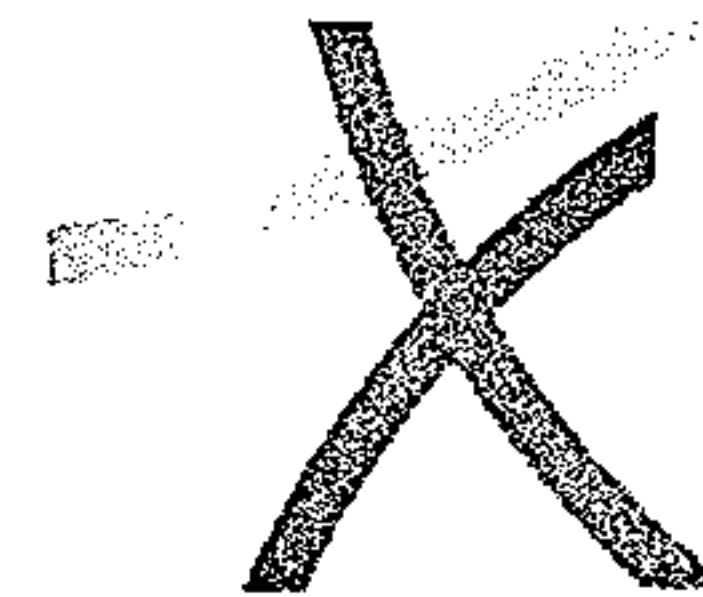

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

$$\text{Пси} = \frac{\text{Сизп/мин}}{\text{Сизп/уч}} \times 20,$$

Където

Сизп/мин е най-краткият срок за изпълнение в календарни дни, предложен от участник;

Сизп/уч е срокът за изпълнение в календарни дни, предложен от участника, чиято оферта се оценява;

„20” е коефициент на относителната тежест Показателя „Срок за изпълнение” (Пси).


1. Оценка по показателя „Срок за изпълнение” (Пси) на участника „БИЛДКОМ БГ” ЕООД

Предложения от участника срок за изпълнение е 60 /шейсет/ календарни дни, който срок е минимален спрямо предложения от другия участник. Съгласно утвърдената от възложителя методика, оценката по показателя „Срок за изпълнение” (Пси) се определи по посочената по-горе формула, както следва:


$$\text{Пси} = \frac{60}{60} \times 20,$$

Оценката на техническото предложение на участника „БИЛДКОМ БГ” ЕООД по показателя „Срок за изпълнение” (Пси) е 20 точки.


----- www.eufunds.bg -----

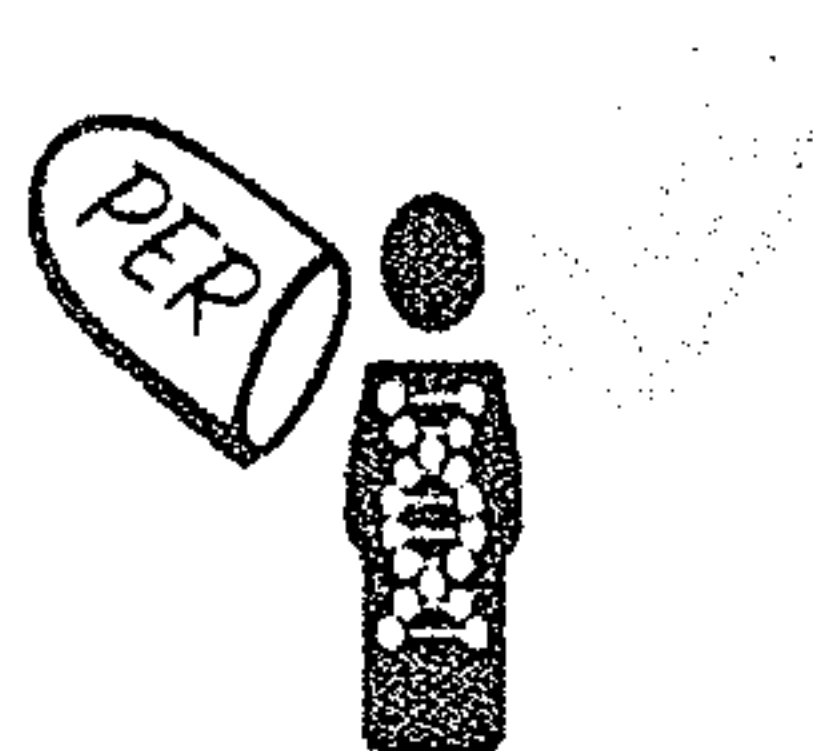

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност
„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

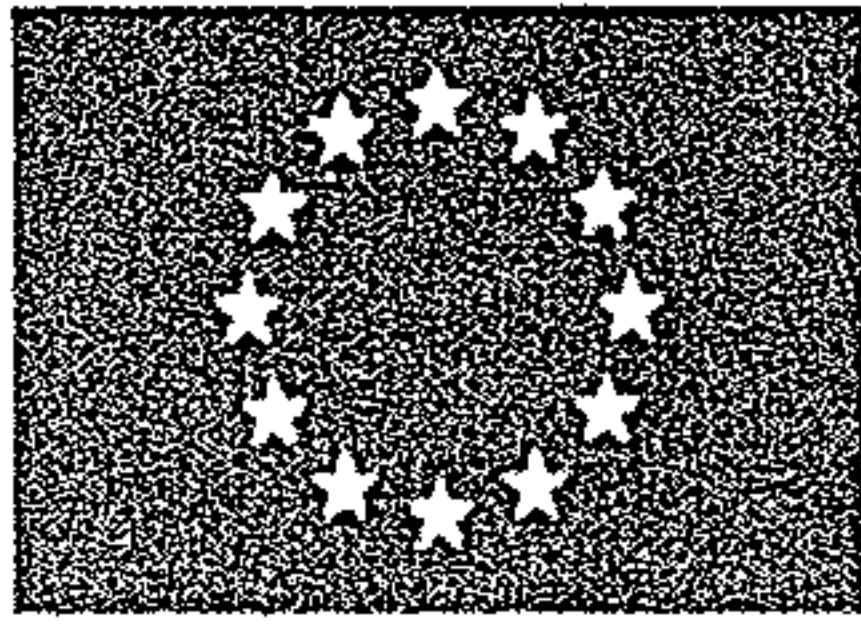

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

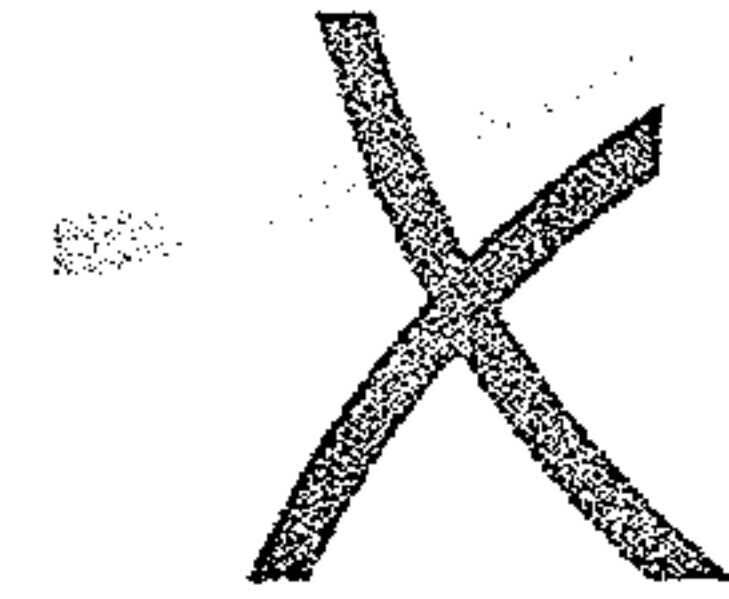

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

2. Оценка по показателя „Срок за изпълнение” (Пси) на участника „ПИРС -Д“ ООД


Предложения от участника срок за изпълнение е 120 /сто и двадесет/ календарни дни. Съгласно утвърдената от възложителя методика, оценката по показателя „Срок за изпълнение” (Пси) се определи по посочената по-горе формула, както следва:

$$\text{Пси} = \frac{60}{120} \times 20,$$


Оценката на техническото предложение на участника „ПИРС -Д“ ООД по показателя „Срок за изпълнение” (Пси) е 10 точки.

С извършване на горните действия приключи етапа по разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците. Комисията реши да насрочи публично заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците, което ще се проведе на 14.02.2020 г от 13.00 часа в заседателна зала на strada НПД на ПУ „Паисий Хилендарски”, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24. На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. За провеждането на публичното заседание по отваряне на ценовите предложения на участниците да се публикува съобщение в Профила на купувача най-малко два работни дни преди провеждането му. В


----- www.eufunds.bg -----

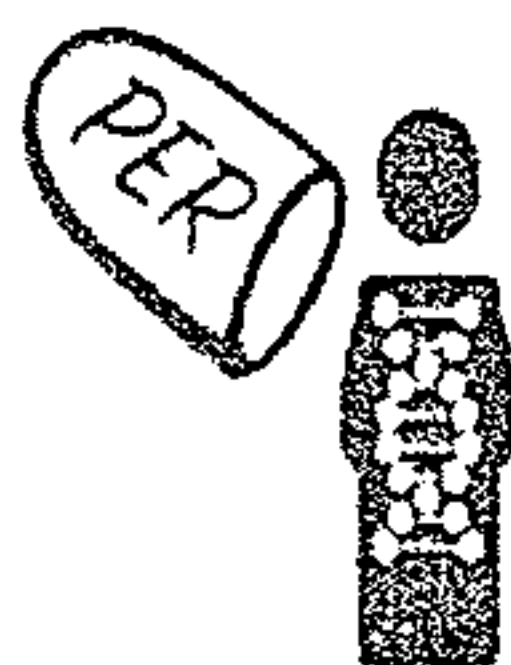

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност
„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

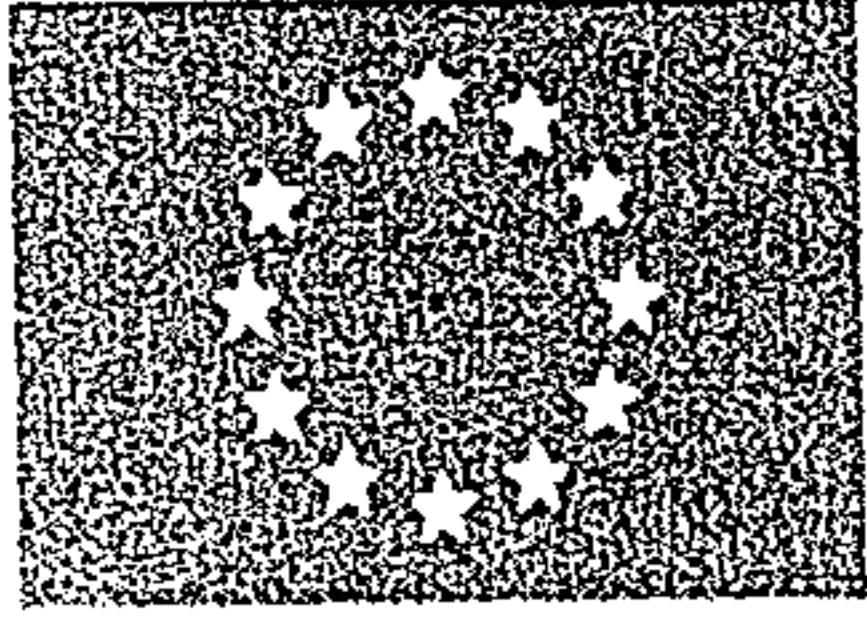

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

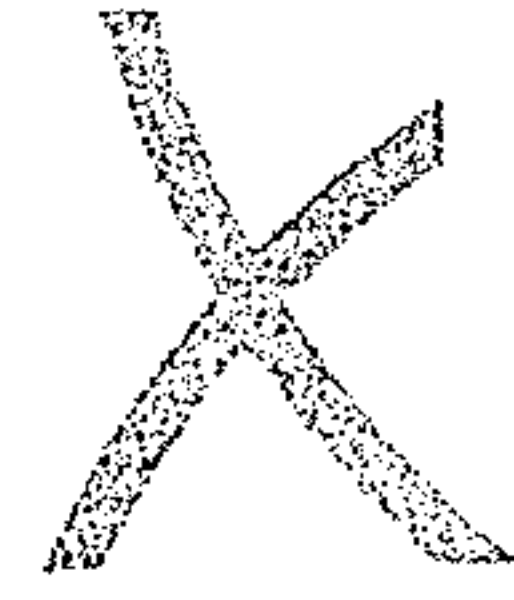

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

съобщението да бъдат посочени датата, часа и мястото на отварянето, както и възможността на отварянето да присъстват лицата по чл.54, ал.1 ППЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на 11.02.2020 г., както следва:

Председател:.....

(Румен Кирилов Киров)

Членове:

1.

(проф. Невена Милева)

.....

(проф. Илия Илиев)


2.

(Иво Кемалов)

4.

(арх. Ганка Богданова)

www.eufunds.bg

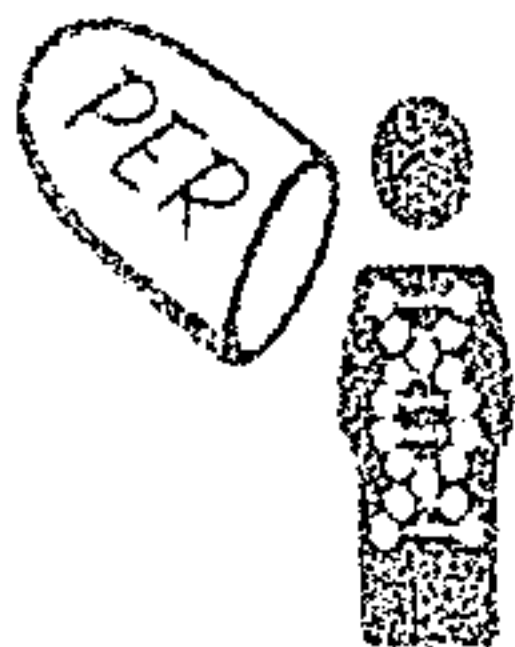

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност
„Персонализирана иновативна медицина (PERIMEU)“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
